TUGAS 1 — IT PROJECT MANAGEMENT

Analisis Distribusi Effort Proyek: Studi Kasus Phoenix Pay System (Kanada)

Mengapa sistem gaji untuk 290.000 pegawai pemerintah gagal, dilihat dari pembagian tenaga dan waktu (effort) proyek

1. Initiating *memulai*
2. Planning *merencanakan*
3. Executing *mengerjakan*
4. Monitoring & Controlling *memeriksa*
5. Closing *menutup*

Nama: EKA PUTRA KURNIA
NIM: 25.55.2927
S2 Informatika — Universitas Amikom Yogyakarta
Dosen: Melwin Syafrizal, Ph.D.

Phoenix Pay: kasusnya dan mengapa dipilih

290.000

pegawai di 101 lembaga digaji lewat Phoenix

C$155 → 274 jt

uang disetujui vs biaya yang ternyata dibutuhkan

> C$520 jt

gaji salah atau terlambat (Juni 2017)

51%

pegawai menerima slip gaji salah (April 2017)

Mengapa kasus ini?


Diperiksa resmi oleh OAG, lembaga pemeriksa negara Kanada (seperti BPK), 2018.

Kerangka sama dengan kuliah: pemeriksa memakai PMBOK Guide.

Angkanya konkret: fitur dibuang, pengujian gagal, jadwal dipadatkan.


C$ = dolar Kanada. Pembangun sistem: IBM. Sumber: OAG Kanada (2018).

Lini waktu: pemeriksaan yang dilewati

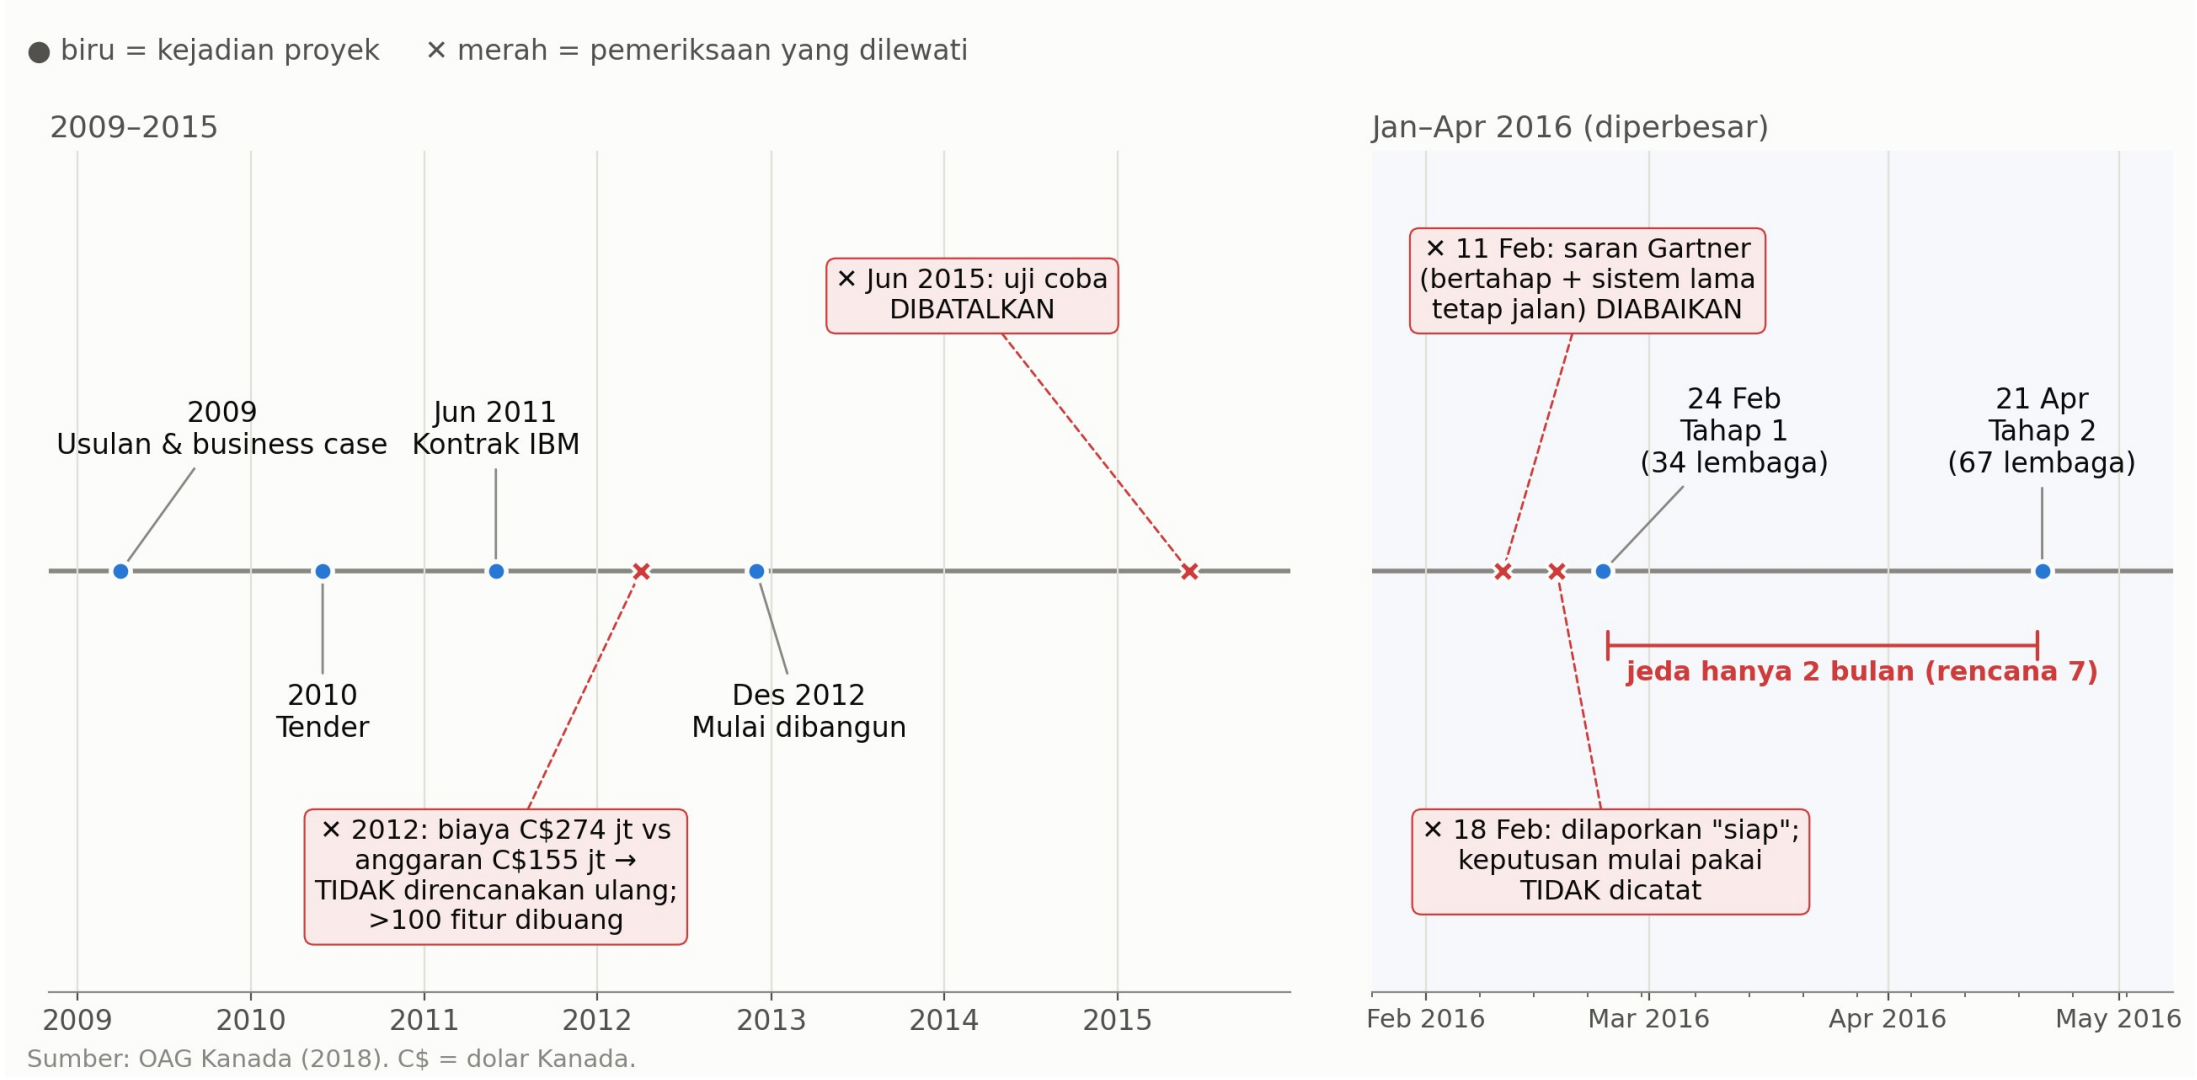

Sumber: OAG Kanada (2018). C$ = dolar Kanada.

Pembagian effort: Phoenix vs angka pembanding

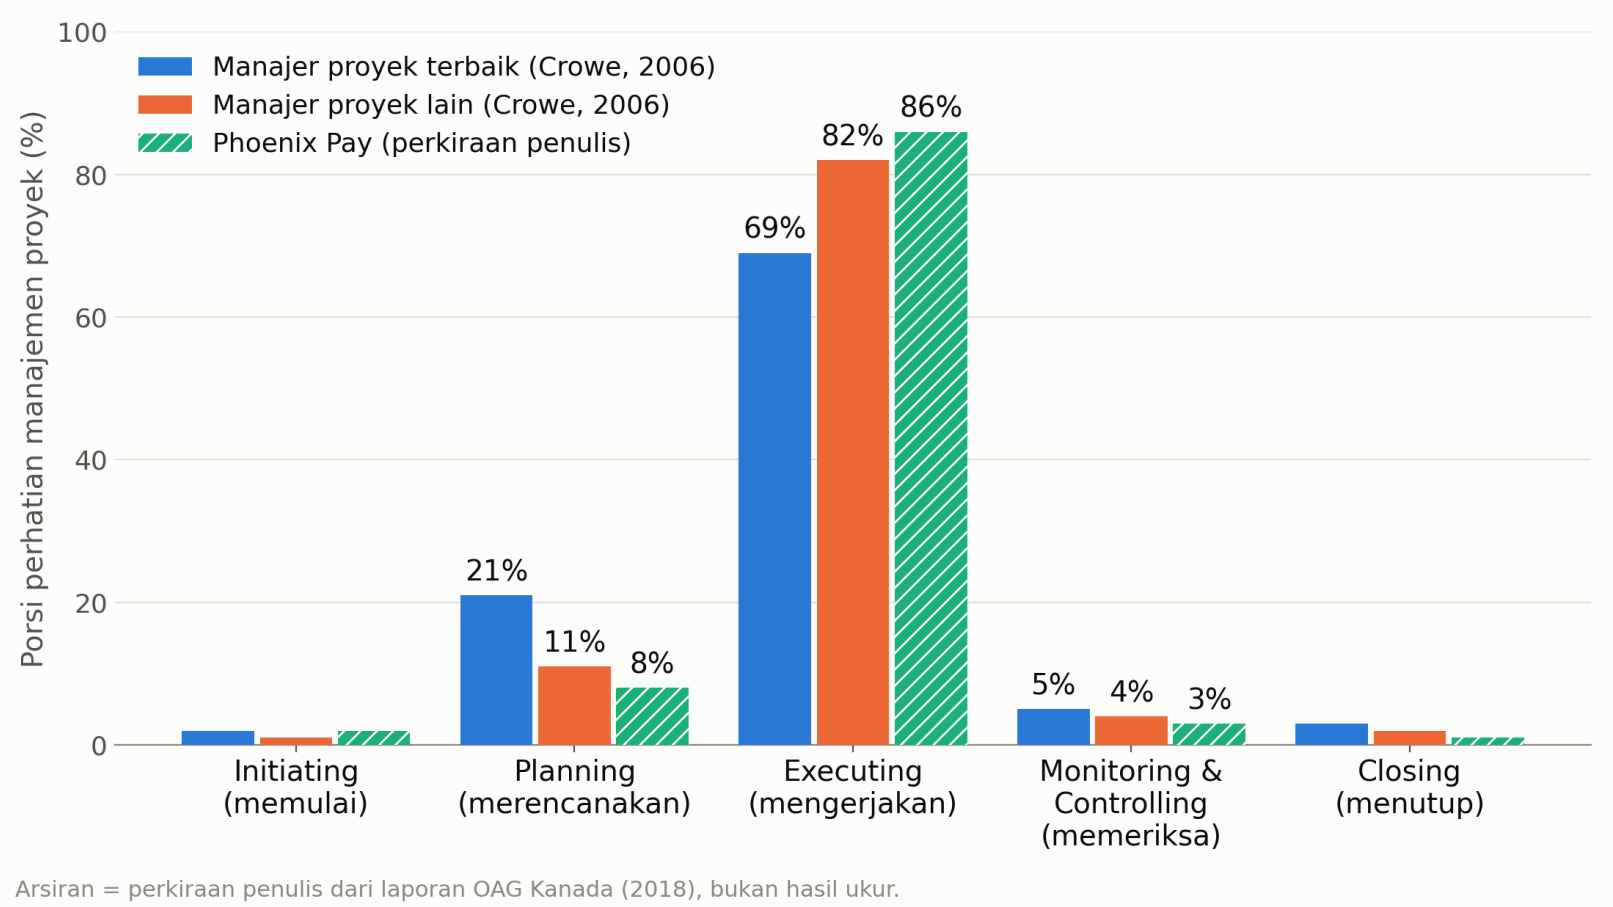

Arsiran = perkiraan penulis dari laporan OAG Kanada (2018), bukan hasil ukur.

Lima kelompok kegiatan

Memulai · merencanakan · mengerjakan · memeriksa · menutup

Berjalan bersamaan sepanjang proyek, bukan bergiliran.

Phoenix (perkiraan)

Merencanakan **~8%**

Mengerjakan **~86%**

Memeriksa & menguji **~3%**

Tiga ketidakseimbangan penyebab kegagalan

1

Rencana tidak disusun ulang

+77%

biaya naik, tetapi yang dilakukan hanya membuang lebih dari 100 fitur

2

Pemeriksaan & pengujian dikurangi

20%

fitur yang gagal diuji tidak diuji ulang; uji coba dibatalkan

3

Tak ada pemeriksaan antartahap

7 → 2 bln

jeda tahap 1 ke tahap 2 dipersingkat; keputusan mulai pakai tidak dicatat

Istilah di slide ini
Fitur: kemampuan sistem, misalnya menghitung lembur atau gaji rapel
Mengapa mutu dikorbankan: tanggal dan uang dikunci, jadi yang dikurangi adalah isi pekerjaan dan pengujian (triple constraint)

Waterfall vs Agile: cara kerja mana yang cocok?

Waterfall (berurutan)	**Hybrid (gabungan)**	Agile (putaran pendek)

▲ cocok untuk Phoenix

Waterfall: menumpuk

Rencana besar di awal

Pengujian menumpuk di akhir

→ paling mudah dikurangi saat jadwal mepet

Agile: menyebar

Rencana kecil di tiap putaran

Diuji & dicoba pengguna tiap 1–4 minggu

→ tidak ada satu titik besar untuk dikurangi

Hybrid untuk Phoenix

Bagian dasar (aturan gaji, keamanan) direncanakan lengkap

Diluncurkan bertahap per lembaga, sistem lama tetap jalan

Fitur yang belum jelas dikerjakan dalam putaran pendek

Istilah di slide ini

Putaran (sprint): satu siklus kerja pendek 1–4 minggu

Alasan hybrid (PMBOK 7): risiko tinggi & aturan ketat → perlu rencana matang; kebutuhan belum pasti & bisa per lembaga → bertahap

Rekomendasi dan pelajaran utama

1. **Memulai**

   Buktikan perkiraan manfaat dengan data nyata

2. **Merencanakan**

   Biaya/jadwal melenceng jauh → wajib rencana baru & lapor

3. **Memeriksa**

   Uji coba dan sistem lama-baru berjalan bersamaan tidak boleh dihapus

4. **Memeriksa & menutup**

   Pemeriksa dari luar tim lapor ke pimpinan; keputusan mulai pakai dicatat tertulis

PELAJARAN UTAMA

Tanggal peluncuran tidak boleh lebih kuat daripada bukti kesiapan

Pola serupa: bank TSB, Inggris (2018) dan Coretax DJP (2025).

Catatan: cara kerja Agile saja tidak cukup; tetap perlu pemeriksa yang tidak memihak.

Relevan untuk BMKG dan proyek TI pemerintah lain.

Daftar istilah (cadangan)

Effort	tenaga dan waktu proyek
Process group	5 kelompok kegiatan mengelola proyek
Initiating	memulai: memutuskan proyek dan tujuannya
Planning	merencanakan: apa, kapan, biaya, risiko
Executing	mengerjakan: membangun sistem
Monitoring & Controlling	memeriksa, menguji, memperbaiki
Closing	menutup: serah terima, evaluasi
PMBOK Guide	buku standar pengelolaan proyek (PMI)
OAG	lembaga pemeriksa negara Kanada (seperti BPK)

Uji coba (pilot)	dicoba di satu tempat dulu
Parallel run	sistem lama dan baru jalan bersamaan
Go-live	mulai dipakai sungguhan
Phase gate	pemeriksaan sebelum tahap berikutnya
Waterfall	berurutan, diluncurkan sekaligus
Agile	putaran pendek, langsung dicoba pengguna
Hybrid	gabungan Waterfall dan Agile
Triple constraint	3 batasan: isi pekerjaan, waktu, biaya
C$	dolar Kanada

Daftar Pustaka

Crowe, A. (2006). Alpha project managers: What the top 2% know that everyone else does not. Velociteach.

Financial Conduct Authority. (2022). Final notice: TSB Bank plc. https://www.fca.org.uk/publication/final-notices/tsb-bank-plc-2022.pdf

Luthfi, E. T. (2026). IT project management: Pertemuan 4 [Slide perkuliahan]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.

Office of the Auditor General of Canada. (2018). Report 1—Building and implementing the Phoenix pay system. 2018 Spring Reports of the Auditor General of Canada.

Project Management Institute. (2008). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (4th ed.). Project Management Institute.

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

