Project Initiation in IT Project Management

Pertemuan 5 — Mata Kuliah Manajemen Proyek IT

DOSEN: MELWIN SYAFRIZAL



Learning Objectives

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar dalam tahap inisiasi proyek IT secara profesional.

1

Memahami Business Case

Menyusun justifikasi bisnis yang kuat untuk mendukung keputusan proyek

2

Identifikasi Stakeholder

Mengenali seluruh pihak yang terlibat dan terdampak oleh proyek

3

Membuat Project Charter

Menyusun dokumen resmi yang memberikan otoritas kepada Project Manager

4


Kick-off Meeting

Memahami tujuan dan agenda pertemuan awal untuk memulai proyek secara resmi

Project Lifecycle

Setiap proyek IT melewati serangkaian fase yang saling berkesinambungan. Tahap **Initiation** adalah fondasi dari seluruh siklus proyek — kesalahan di sini berdampak besar pada fase berikutnya.

1. **Initiation**
   Definisi & persetujuan proyek
2. **Planning**
   Penyusunan rencana detail
3. **Execution**
   Pelaksanaan pekerjaan proyek
4. **Monitoring**
   Pengendalian & pengawasan
5. **Closing**
   Penutupan & evaluasi proyek

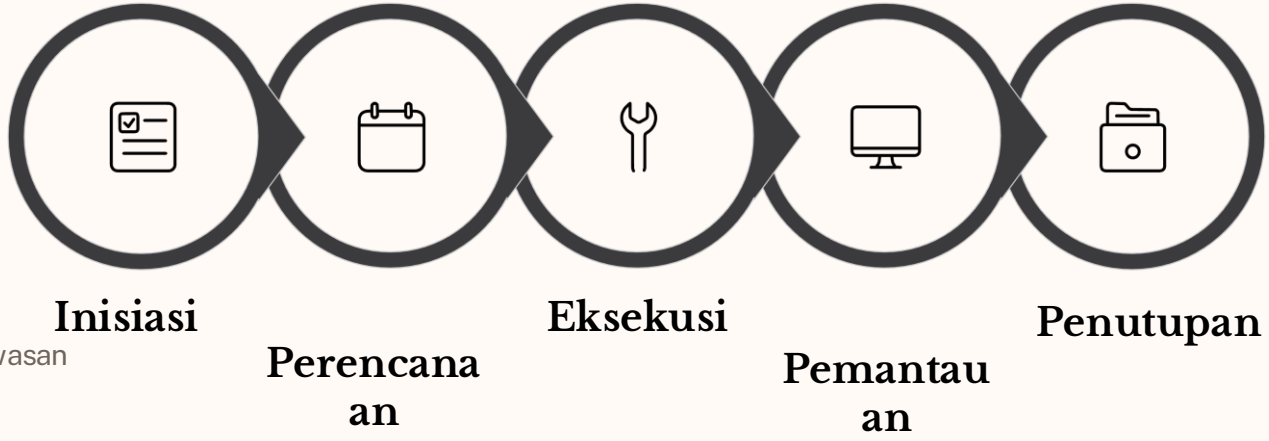

Fokus pertemuan ini: **Tahap Initiation** — titik awal yang menentukan arah seluruh proyek.



Apa itu Project Initiation?

Project Initiation adalah **tahap pertama dan paling fundamental** dalam siklus manajemen proyek. Pada fase ini, sebuah ide atau kebutuhan bisnis dianalisis secara mendalam untuk menentukan apakah proyek layak dikerjakan.

Mendefinisikan Proyek

Menetapkan tujuan, ruang lingkup awal, dan hasil yang diharapkan dari proyek TI

Mendapatkan Persetujuan

Memperoleh otorisasi resmi dari sponsor atau pimpinan organisasi untuk memulai proyek

Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan

Mengenali semua pihak yang berkepentingan dan akan terpengaruh oleh jalannya proyek

Inisiasi yang lemah adalah penyebab utama kegagalan proyek — lebih dari 40% proyek gagal karena tujuan yang tidak jelas sejak awal.

Output Tahap Initiation

Tiga dokumen utama yang dihasilkan pada tahap inisiasi menjadi acuan resmi bagi seluruh tim dan pemangku kepentingan sepanjang proyek berlangsung.







📄 Business Case

Dokumen yang menjelaskan justifikasi bisnis, manfaat, biaya, dan risiko proyek. Menjawab pertanyaan: *"Mengapa proyek ini perlu dilakukan?"*

👥 Stakeholder Register

Daftar lengkap semua pihak yang terlibat atau terdampak proyek beserta peran, pengaruh, dan strategi keterlibatan mereka.

📋 Project Charter

Dokumen resmi yang memberikan otoritas kepada Project Manager untuk menjalankan proyek dan menggunakan sumber daya organisasi.



Business Case

Business Case adalah **dokumen justifikasi bisnis** yang menjelaskan alasan mengapa sebuah proyek layak untuk dilaksanakan dari sudut pandang organisasi. Dokumen ini menjadi dasar pengambilan keputusan oleh sponsor dan manajemen puncak.

Business Case bukan sekadar proposal teknis — ia adalah argumen strategis yang menghubungkan kebutuhan bisnis dengan solusi yang ditawarkan oleh proyek. Tanpa Business Case yang kuat, sulit bagi pemangku kepentingan untuk menyetujui pengalokasian anggaran dan sumber daya.

Dokumen ini menjawab pertanyaan mendasar: **"Mengapa proyek ini perlu dilakukan?"** Business Case disusun oleh inisiator proyek dan diajukan kepada sponsor atau dewan direksi untuk mendapatkan persetujuan anggaran dan sumber daya. Tanpa Business Case yang kuat, proyek berisiko tidak mendapat dukungan organisasi.

Business Case bukan sekadar formalitas — ini adalah alat pengambilan keputusan strategis yang menentukan nasib sebuah proyek TI.

Business Case yang baik menjadi "kontrak moral" antara tim proyek dan organisasi — memastikan semua pihak memahami nilai yang akan dihasilkan.

Komponen Business Case

Sebuah Business Case yang komprehensif mencakup lima komponen inti yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kelayakan proyek.

1

Problem Statement

Deskripsi masalah atau peluang yang mendorong kebutuhan proyek. Harus spesifik, terukur, dan relevan bagi organisasi.

2

Objective

Tujuan yang ingin dicapai oleh proyek, dinyatakan dalam format SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

3

Benefit

Manfaat yang akan diperoleh, baik bersifat finansial (ROI, penghematan biaya) maupun non-finansial (efisiensi, kepuasan pengguna).

4

Cost Estimate

Estimasi biaya total proyek mencakup biaya pengembangan, implementasi, pelatihan, dan pemeliharaan jangka panjang.

5

Risk Overview

Identifikasi risiko utama yang dapat mengancam keberhasilan proyek beserta rencana mitigasi awal.



Contoh Kasus: IoT Smart Waste Management

Sebagai ilustrasi nyata, perhatikan proyek **Sistem Manajemen Sampah Berbasis IoT** di lingkungan perkotaan.

🗑️ Problem

Penumpukan sampah tidak terpantau secara real-time menyebabkan overflow tempat sampah, keluhan warga, dan biaya pengangkutan yang tidak efisien.

🎯 Objective

Membangun sistem IoT yang memantau tingkat kepenuhan tempat sampah secara otomatis dan mengirimkan notifikasi ke petugas kebersihan.

✅ Benefit

Pengurangan biaya operasional 30%, peningkatan kebersihan kota, dan optimasi rute pengangkutan sampah.

💰 Cost

Estimasi investasi Rp 500 juta untuk 500 sensor IoT, platform cloud, dan aplikasi monitoring selama 12 bulan.

⚠️ Risk

Ketergantungan konektivitas jaringan, vandalisme sensor, dan resistensi perubahan dari petugas lapangan.

Analisis Kelayakan (Feasibility Study)

Sebelum proyek disetujui, perlu dilakukan analisis kelayakan dari tiga dimensi utama untuk memastikan proyek dapat dilaksanakan dengan sukses.



Financial Feasibility

Apakah investasi proyek sebanding dengan manfaat yang diperoleh? Analisis mencakup **ROI, Payback Period, NPV**, dan perbandingan biaya vs. manfaat jangka panjang.



Technical Feasibility

Apakah teknologi yang dibutuhkan tersedia dan dapat diimplementasikan? Mencakup ketersediaan infrastruktur, **kompetensi tim teknis**, dan kematangan teknologi yang akan digunakan.



Operational Feasibility

Apakah organisasi siap menerima dan mengoperasikan sistem baru? Meliputi kesiapan SDM, proses bisnis, **change management**, dan dukungan manajemen.



Ketiga dimensi kelayakan ini harus dipenuhi secara bersamaan. Kelayakan finansial saja tidak cukup jika secara teknis atau operasional proyek tidak siap dijalankan.



Siapa itu Stakeholder?

Stakeholder adalah **individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan, dipengaruhi oleh, atau dapat mempengaruhi jalannya dan hasil sebuah proyek**. Memahami stakeholder adalah kunci keberhasilan komunikasi dan manajemen proyek.

Mengapa Stakeholder Penting?

- Mereka menyediakan sumber daya dan anggaran
- Keputusan mereka mempengaruhi arah proyek
- Kepuasan mereka menentukan keberhasilan proyek
- Resistensi mereka dapat menghambat pelaksanaan

Dampak Pengabaian Stakeholder

- Perubahan scope yang tidak terduga
- Penolakan hasil akhir proyek
- Konflik kepentingan yang tidak terkelola
- Proyek dihentikan di tengah jalan

Identifikasi Stakeholder: Internal vs. External

Stakeholder dapat diklasifikasikan berdasarkan posisinya terhadap organisasi. Identifikasi yang lengkap memastikan tidak ada pihak penting yang terlewat dalam proses komunikasi proyek.

Stakeholder Internal

Pihak-pihak yang berada di dalam organisasi pelaksana proyek:

- **Project Sponsor** — pemberi dana dan otoritas tertinggi proyek
- **Project Manager** — pemimpin tim proyek
- **Tim Proyek** — developer, analis, desainer
- **Manajemen Puncak** — direksi dan kepala divisi
- **Departemen Terkait** — IT, keuangan, HR

Stakeholder External

Pihak-pihak di luar organisasi yang terlibat atau terdampak:

- **Klien / Pengguna Akhir** — penerima manfaat utama sistem
- **Vendor & Supplier** — penyedia teknologi dan infrastruktur
- **Regulator / Pemerintah** — lembaga pengawas dan pemberi izin
- **Masyarakat** — pihak yang terdampak tidak langsung
- **Mitra Bisnis** — organisasi yang berkolaborasi

Stakeholder Register


Stakeholder Register adalah dokumen terstruktur yang mendaftar semua informasi relevan tentang setiap stakeholder. Dokumen ini menjadi referensi utama dalam mengelola komunikasi dan keterlibatan sepanjang proyek.

Nama / Pihak	Peran	Pengaruh	Kepentingan	Catatan Strategi
Kepala Dinas	Project Sponsor	Tinggi	Tinggi	Libatkan intensif, laporan rutin
Tim IT Kota	Tim Teknis	Sedang	Tinggi	Koordinasi teknis mingguan
Vendor IoT	Supplier	Sedang	Sedang	Pantau kontrak dan deliverable
Petugas Kebersihan	End User	Rendah	Tinggi	Pelatihan dan sosialisasi
Masyarakat Kota	Beneficiary	Rendah	Sedang	Informasi publik berkala

Stakeholder Matrix: Power vs. Interest Grid

Matrix Power-Interest membantu Project Manager menentukan **strategi komunikasi yang tepat** untuk setiap kelompok stakeholder berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan mereka terhadap proyek.



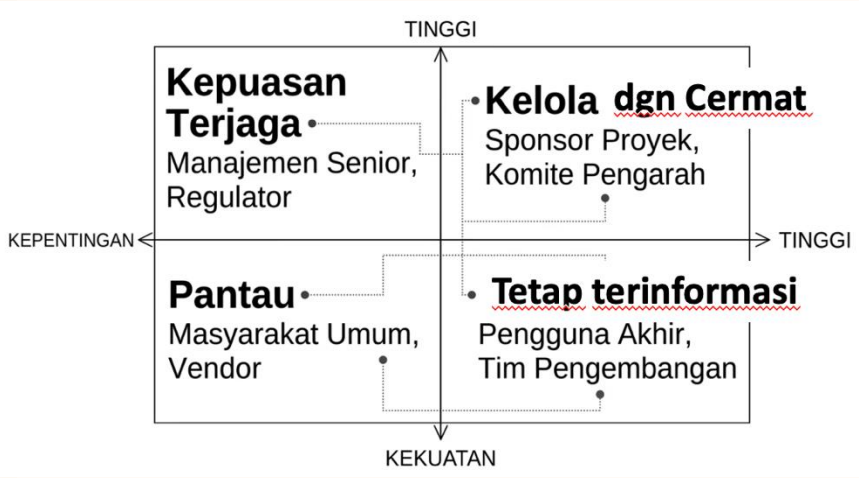

Pemetaan ini bersifat dinamis — posisi stakeholder dapat berubah seiring perkembangan proyek, sehingga matrix perlu diperbarui secara berkala.

Strategi Manajemen Stakeholder

Setelah stakeholder dipetakan, Project Manager harus merancang strategi komunikasi dan keterlibatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok.

🔴 Manage Closely (High Power, High Interest)

Libatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Adakan pertemuan rutin, berikan laporan progress detail, dan pastikan ekspektasi mereka terpenuhi.

🟡 Keep Satisfied (High Power, Low Interest)

Jaga kepuasan mereka tanpa membebani dengan detail teknis. Kirimkan ringkasan eksekutif dan libatkan dalam keputusan besar saja.

🔵 Keep Informed (Low Power, High Interest)

Berikan informasi perkembangan proyek secara reguler melalui newsletter, email update, atau forum diskusi agar mereka tetap engaged.

⚪ Monitor (Low Power, Low Interest)

Pantau perubahan posisi mereka. Berikan informasi minimal namun pastikan mereka tidak merasa diabaikan sepenuhnya.

Strategi Manajemen Stakeholder

Setelah pemetaan stakeholder selesai, langkah berikutnya adalah menetapkan strategi komunikasi dan keterlibatan yang sesuai untuk masing-masing kelompok pemangku kepentingan.



Identifikasi

Temukan semua pihak yang relevan dengan proyek secara sistematis



Analisis

Petakan power dan interest setiap stakeholder menggunakan matriks



Rencanakan

Tentukan frekuensi, format, dan saluran komunikasi yang tepat



Engage

Laksanakan strategi keterlibatan dan pantau respons stakeholder

Komunikasi yang proaktif dan terencana adalah kunci untuk menjaga kepercayaan stakeholder dan mencegah konflik kepentingan selama proyek berlangsung.

Project Charter

Project Charter adalah **dokumen resmi yang secara formal mengotorisasi keberadaan sebuah proyek** dan memberikan wewenang kepada Project Manager untuk menggunakan sumber daya organisasi dalam menjalankan aktivitas proyek.

Dokumen ini merupakan "surat kuasa" pertama yang diterima Project Manager — tanpa Project Charter, seorang PM tidak memiliki legitimasi formal untuk memimpin tim, mengelola anggaran, atau mengambil keputusan proyek.

⚠ Project Charter harus ditandatangani oleh **Project Sponsor atau manajemen puncak** agar memiliki kekuatan hukum dan organisasional yang sah.



Fungsi Project Charter

Project Charter memiliki tiga fungsi strategis yang sangat krusial dalam ekosistem manajemen proyek.



Memberikan Otoritas PM

Secara resmi mengangkat Project Manager dan memberikan kewenangan untuk memimpin tim, mengelola sumber daya, serta membuat keputusan operasional proyek.



Menyamakan Pemahaman

Memastikan seluruh stakeholder memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, ruang lingkup, dan batasan proyek sejak hari pertama.



Menghubungkan ke Strategi Bisnis

Menegaskan keterkaitan antara proyek dengan tujuan strategis organisasi sehingga investasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Komponen Utama Project Charter

Project Charter yang lengkap mencakup elemen-elemen berikut yang memberikan gambaran komprehensif tentang proyek pada level tinggi.

Komponen Wajib

- **Project Title** — nama resmi proyek
- **Project Objective** — tujuan terukur yang ingin dicapai
- **Scope Statement** — apa yang termasuk dan tidak termasuk
- **High-level Timeline** — milestone dan tenggat waktu utama
- **Budget Estimate** — perkiraan anggaran keseluruhan

Komponen Pendukung

- **Project Manager** — nama dan wewenang yang diberikan
- **Key Stakeholders** — daftar pemangku kepentingan utama
- **Assumptions** — asumsi yang mendasari perencanaan
- **Constraints** — batasan waktu, biaya, atau teknologi
- **Sponsor Signature** — tanda tangan persetujuan resmi

Komponen Project Charter

Sebuah Project Charter yang lengkap dan efektif harus mencakup komponen-komponen berikut ini. Setiap elemen memiliki fungsi spesifik dalam mendefinisikan dan memformalisasi proyek.

📋 Project Title

Nama resmi proyek yang singkat, jelas, dan deskriptif

🎯 Objective

Tujuan SMART yang ingin dicapai melalui proyek ini

📐 Scope

Batasan ruang lingkup — apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek

📅 Timeline

Estimasi durasi dan milestone utama proyek secara high-level

💰 Budget

Estimasi anggaran total yang disetujui untuk menjalankan proyek

✍️ Authorization

Tanda tangan sponsor sebagai bukti persetujuan dan komitmen resmi

Contoh Charter: Aplikasi Mobile Bank Sampah

Berikut adalah contoh ringkasan Project Charter untuk proyek pengembangan aplikasi mobile Bank Sampah berbasis komunitas.

Project Title	**Pengembangan Aplikasi Mobile Bank Sampah Komunitas**
Objective	Membangun aplikasi Android/iOS untuk pengelolaan setoran sampah daur ulang warga dalam 6 bulan
Scope	Modul registrasi warga, pencatatan setoran, konversi poin, dan dashboard admin. *Tidak termasuk*: integrasi marketplace.
Timeline	Januari – Juni 2025. Milestone: Prototyping (Feb), Beta Testing (Mei), Go-live (Juni)
Budget	Rp 180.000.000 (termasuk pengembangan, infrastruktur cloud, dan pelatihan)
Project Manager	Dian Pratiwi, S.Kom — Wewenang penuh atas tim teknis dan vendor
Sponsor	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Best Practice dalam Penyusunan Project Charter

Mengikuti praktik terbaik berikut akan memastikan Project Charter yang Anda buat efektif sebagai fondasi proyek yang kuat.

Tetap pada Level High-Level

Charter bukan dokumen perencanaan detail. Hindari spesifikasi teknis mendalam — simpan untuk dokumen perencanaan berikutnya. Cukup cakup scope, tujuan, dan batasan utama.

Dapatkan Persetujuan Sponsor

Charter harus ditinjau dan ditandatangani oleh sponsor sebelum pekerjaan proyek dimulai. Tanda tangan sponsor adalah legitimasi formal yang tidak bisa digantikan.

Libatkan Stakeholder Kunci

Minta masukan dari stakeholder utama sebelum finalisasi. Dokumen yang dibuat sepihak berisiko tidak mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dari organisasi.

Simpan sebagai Referensi Hidup

Charter dapat direvisi bila terjadi perubahan besar dalam proyek, namun setiap perubahan harus melalui proses formal change request dan disetujui sponsor.



Kick-off Meeting

Kick-off Meeting adalah **pertemuan formal pertama antara tim proyek dan seluruh stakeholder kunci** yang menandai dimulainya pelaksanaan proyek secara resmi setelah Project Charter disetujui.

Lebih dari sekadar pertemuan perkenalan, kick-off meeting adalah momen kritis untuk menyamakan persepsi, membangun semangat tim, dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang seragam tentang tujuan, peran, dan harapan terhadap proyek.

Kick-off yang efektif meningkatkan kohesi tim hingga 60% dan mengurangi risiko miskomunikasi pada fase eksekusi secara signifikan.

Tujuan Kick-off Meeting


Kick-off meeting dirancang untuk mencapai beberapa tujuan strategis sekaligus dalam satu sesi yang terstruktur.

Menyamakan Visi

Memastikan semua pihak memahami tujuan akhir dan nilai yang ingin dicapai proyek

Menetapkan Timeline

Menyepakati milestone utama, tenggat waktu, dan cara kerja selama proyek berlangsung

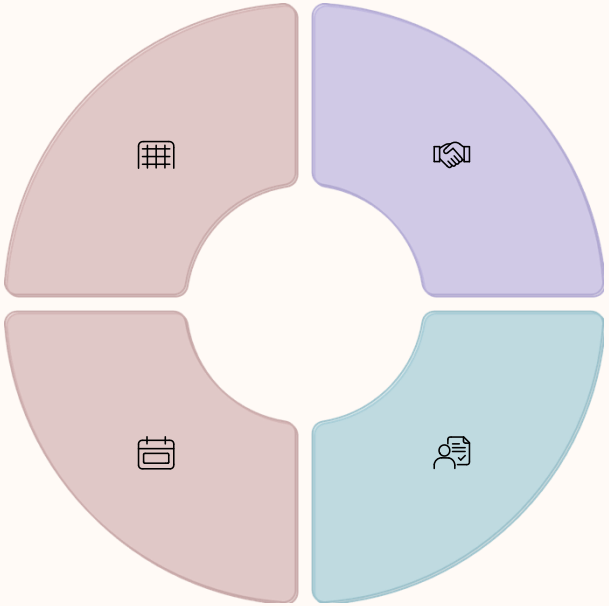

Membangun Tim

Memperkenalkan anggota tim, membangun kepercayaan, dan menetapkan norma kerja bersama

Menetapkan Peran

Mengklarifikasi tanggung jawab setiap anggota tim dan jalur eskalasi keputusan

Agenda Kick-off Meeting

Agenda yang terstruktur memastikan kick-off meeting berjalan efektif dan mencakup semua elemen penting dalam waktu yang tersedia.

01

Pembukaan & Perkenalan (15 menit)

Sambutan dari Project Sponsor, perkenalan Project Manager dan seluruh anggota tim proyek, serta penjelasan agenda pertemuan.

02

Latar Belakang & Tujuan Proyek (20 menit)

Presentasi Business Case secara ringkas, tujuan strategis proyek, dan manfaat yang diharapkan bagi organisasi.

03

Scope & Deliverable (20 menit)

Penjelasan ruang lingkup proyek, batasan yang berlaku, dan hasil akhir yang akan diserahkan kepada stakeholder.

04

Timeline & Milestone (15 menit)

Review jadwal proyek secara keseluruhan, milestone kunci, dan titik-titik review yang memerlukan keputusan stakeholder.

ĆD

Peran, Komunikasi & Q&A (20 menit)

Klarifikasi peran dan tanggung jawab tim, protokol komunikasi, frekuensi rapat, dan sesi tanya jawab terbuka.

Integrasi Dokumen Inisiasi

Ketiga dokumen utama inisiasi bukan entitas yang berdiri sendiri — mereka membentuk **rantai dokumen yang saling terhubung** dan mengalir secara logis dari satu ke yang berikutnya.




Business Case membuktikan bahwa proyek *layak dilakukan*. Project Charter memastikan proyek *diotorisasi secara resmi*. Kick-off Meeting memastikan semua pihak *siap memulai*. Ketiganya harus diselesaikan secara berurutan sebelum fase Planning dimulai.

Melewati salah satu tahapan ini — misalnya langsung ke eksekusi tanpa Charter — adalah salah satu kesalahan paling umum yang menyebabkan proyek IT gagal.

Integrasi: Business Case → Charter → Kick-off

Ketiga elemen utama tahap inisiasi bukan dokumen yang berdiri sendiri — ketiganya membentuk alur yang saling terhubung dan berkesinambungan membawa proyek dari sekadar ide menuju eksekusi nyata.

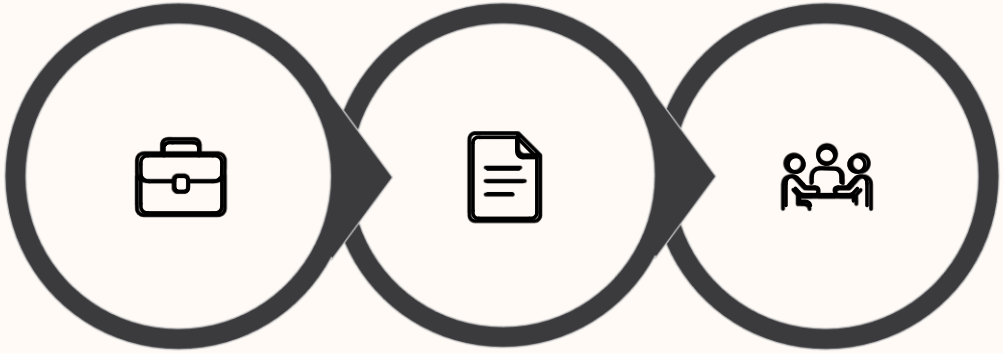

Business Case | **Project Charter** | **Kick-off**

Mengapa Integrasinya Penting?

Setiap dokumen membangun di atas yang sebelumnya. Business Case menjawab "Mengapa?", Charter menjawab "Apa dan Siapa?", sementara Kick-off menjawab "Bagaimana kita mulai bersama-sama?"

Risiko Jika Terputus

Jika salah satu elemen dilewati, proyek berisiko berjalan tanpa justifikasi yang kuat, tanpa otoritas yang jelas, atau tanpa keselarasan tim — yang semuanya dapat berujung pada kegagalan proyek.

Studi Kasus: IoT Monitoring Kampus

Sebagai latihan integratif, perhatikan studi kasus berikut: **Proyek Sistem IoT Monitoring Fasilitas Kampus** di sebuah universitas negeri.

Konteks Proyek

Universitas ingin memantau penggunaan energi listrik, air, dan kondisi ruangan (suhu, kelembaban) di 15 gedung secara real-time menggunakan sensor IoT yang terhubung ke dashboard terpusat.

Business Case

Target penghematan energi 25% per tahun (setara Rp 400 juta), peningkatan kenyamanan ruang belajar, dan data berbasis fakta untuk perencanaan pemeliharaan gedung.

Stakeholder Utama

- **Rektor** — Sponsor (High Power, High Interest)
- **Biro Sarana Prasarana** — Key User (High Interest)
- **Tim IT Kampus** — Implementor Teknis
- **Dosen & Mahasiswa** — End User
- **Vendor Sensor IoT** — Supplier Eksternal

Deliverable Inisiasi

- Business Case: Analisis kelayakan 3 dimensi
- Stakeholder Register: 12 pihak terdaftar
- Project Charter: Disetujui Rektor

Tugas Mahasiswa

Untuk mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari, setiap mahasiswa/kelompok diminta menyelesaikan tugas berikut sebelum pertemuan berikutnya.

📋 Tugas 1: Project Charter

Buatlah Project Charter untuk proyek IT pilihan Anda (minimal 5 halaman). Wajib mencakup: Project Title, Objective (SMART), Scope Statement, High-level Timeline dengan minimal 4 milestone, Budget Estimate, daftar stakeholder utama, asumsi & batasan, serta tanda tangan sponsor simulasi.

👥 Tugas 2: Stakeholder Register

Identifikasi minimal 8 stakeholder dari proyek yang sama. Buat register dalam format tabel yang memuat: nama/pihak, peran, kategori (internal/eksternal), level pengaruh, level kepentingan, dan strategi komunikasi yang direkomendasikan.


📊 Bonus: Stakeholder Matrix

Petakan stakeholder Anda ke dalam Power-Interest Grid dan jelaskan secara singkat strategi manajemen untuk setiap kuadran berdasarkan kondisi proyek yang Anda pilih.

⚠ Deadline pengumpulan: **Satu minggu sebelum pertemuan berikutnya**. Format: PDF dengan nama file `NIM_Nama_Tugas5.pdf`. Upload ke portal LMS Kampus.


PMBOK Project Management Framework

Seluruh materi Project Initiation yang telah dipelajari berpijak pada **PMBOK (Project Management Body of Knowledge)** — standar manajemen proyek internasional yang diakui secara global oleh PMI (Project Management Institute).



Initiation

Business Case, Stakeholder Register, Project Charter — fondasi seluruh proyek ✅



Planning

WBS, Jadwal Detail, Rencana Risiko, Rencana Komunikasi



Execution

Pengerjaan deliverable, manajemen tim, dan komunikasi stakeholder



Monitoring & Controlling

Pengendalian scope, jadwal, biaya, kualitas, dan risiko secara berkelanjutan



Closing

Serah terima deliverable, penutupan kontrak, dan lessons learned dokumentasi

Pertemuan selanjutnya: Project Planning — WBS & Schedule Management
